

# 登戸小学校 校舎増築工事について

---

令和7年12月4日

川崎市教育委員会事務局 教育環境整備推進室

川崎市立登戸小学校

# 1. 校舎増築の経緯

## ▶ 登戸小学校の現況

### 既存校舎・体育館

建物名称	主要諸室	建築年月	構造	階数	延床面積
校舎A棟	普通教室（8+3）、音楽室、図工室、特別活動室、給食室 ほか	S48.8※、S52.3※、S57.11(築43～52年)	RC	3階	約1,800㎡
校舎B棟	普通教室（8）、家庭科室、学習室、多目的室、保健室 ほか	S34.3※、S42.3※、S44.3※、S55.3、S57.11(築43～66年)	RC (一部S)	3階	約2,100㎡
校舎C棟	普通教室（8）、図書室、理科室、多目的室、校長室、職員室 ほか	S57.11(築43年)	RC	3階	約2,400㎡
体育館	屋内運動場、更衣室、倉庫 ほか	S59.2(築41年)	S	2階	約700㎡





※H17耐震補強

### 現在の既存校舎の主要諸室（転用教室含む）

- 普通教室24教室（普通学級）、3教室（特別支援学級）
- 特別教室5（音楽室、理科室、家庭科室、図書室、図工室、学習室、多目的室）
- 管理諸室（校長室、職員室、保健室、放送室ほか）
- 給食室（1,000食）

# 1. 校舎増築の経緯

## ▶ 登戸小学校の現況

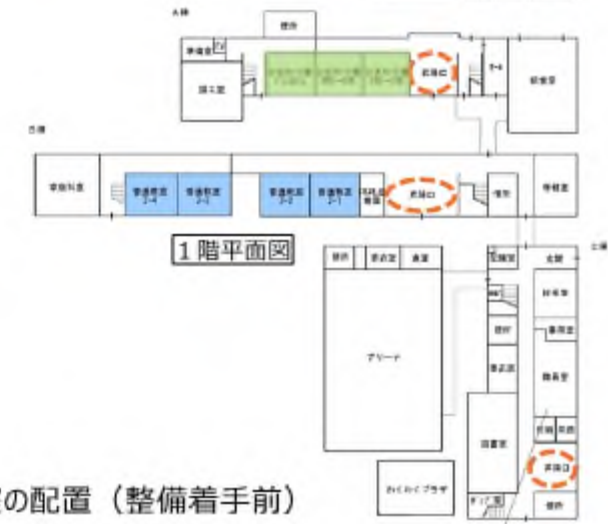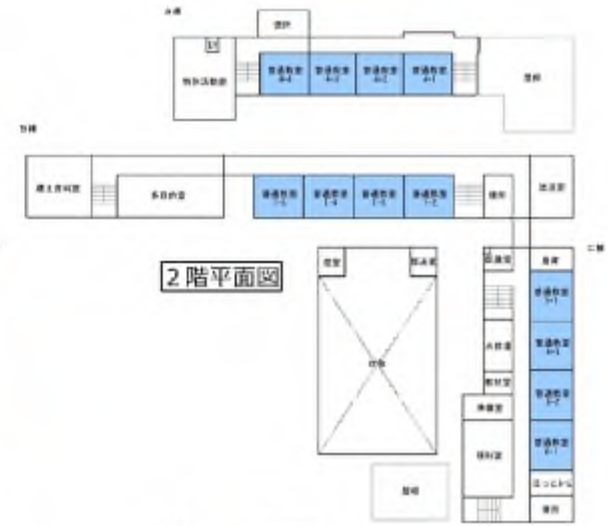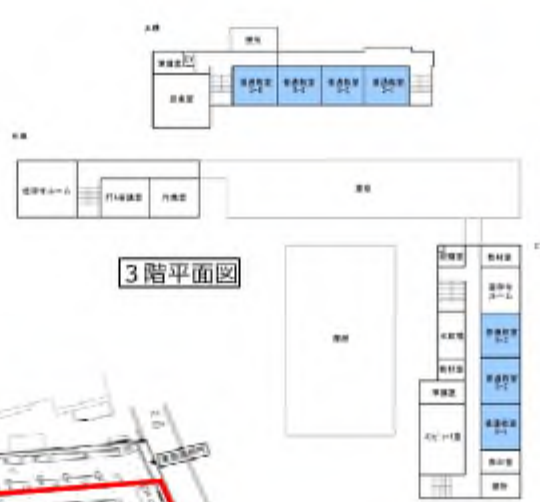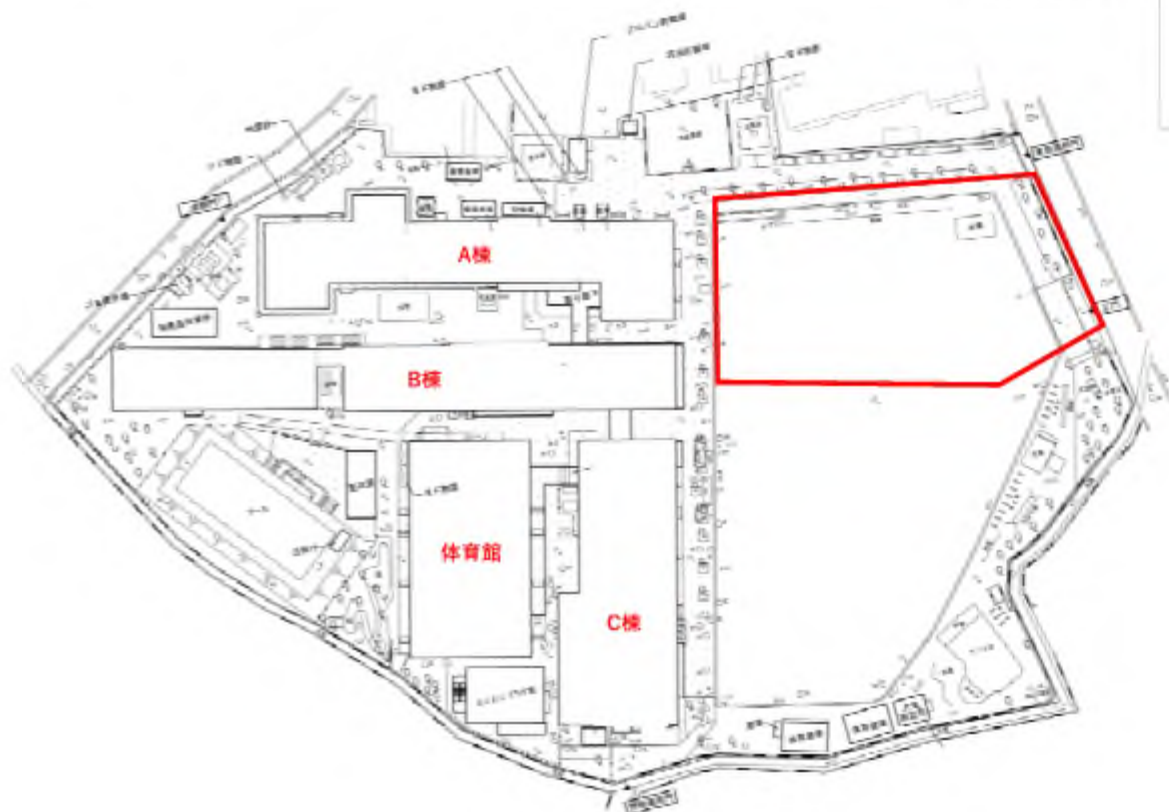

既存校舎の諸室の配置（整備着手前）

# 1. 校舎増築の経緯

## ▶ 登戸小学校の現況

将来的な児童数の増加とこれに併せた教職員数の増加が見込まれ、普通教室と特別教室の不足と職員室等の管理諸室の狭あい化などが見込まれている。

普通学級

種別	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
登戸小(児童数)	770	856	885	903	950	1,003	1,049
登戸小(学級数)	25	27	28	28	30	32	33

### <今後の見込み>

- ・登戸駅から向ヶ丘遊園駅周辺までの約37.2haで登戸土地区画整理事業（S63.9～R8.3）が進められ、登戸小学校の通学区域の広い範囲で戸建住宅や共同住宅が建設されている。
- ・登戸駅前地区第一種市街地開発事業（R7-11）による地上38階、地下2階の住宅・店舗の建設予定がある。

- ・R7の770人は、R12に1,000人（33学級）を超える推計
- ・将来的に36学級にまで増加する可能性がある

▶ 今後も長期にわたり児童増が続く見込みで、良好な教育環境を確保していくため、校舎の増築を行う必要がある。

### ① 普通教室

将来的な児童数の増加が見込まれ、普通教室の不足が見込まれる。

既存校舎を含め36学級（増築6+転用2、既存24+転用4）まで対応する。

### ② 特別教室

児童数の増加に伴い、特別教室（特に理科室、音楽室）が不足している。

増築校舎棟に理科室、音楽室、図書室を確保する。

### ③ 管理諸室

教職員数の増加による職員室等の管理諸室が狭あい化している。

【別途工事】により、既存校舎の職員室拡張改修を実施する（予定）

### ④ 給食室


児童数の増加、教職員数の増加に伴い、既存給食室の調理可能食数（1,000食）に不足が生じている。

増築校舎棟に1,200食に対応する給食室を整備する。

# 1. 校舎増築の経緯

## ▶ 整備位置の検討など

普通教室		給食室
Aエリア	既存プール位置	合築 or 別棟 (既存位置)
Bエリア	校庭南側	
Cエリア	校庭北側	

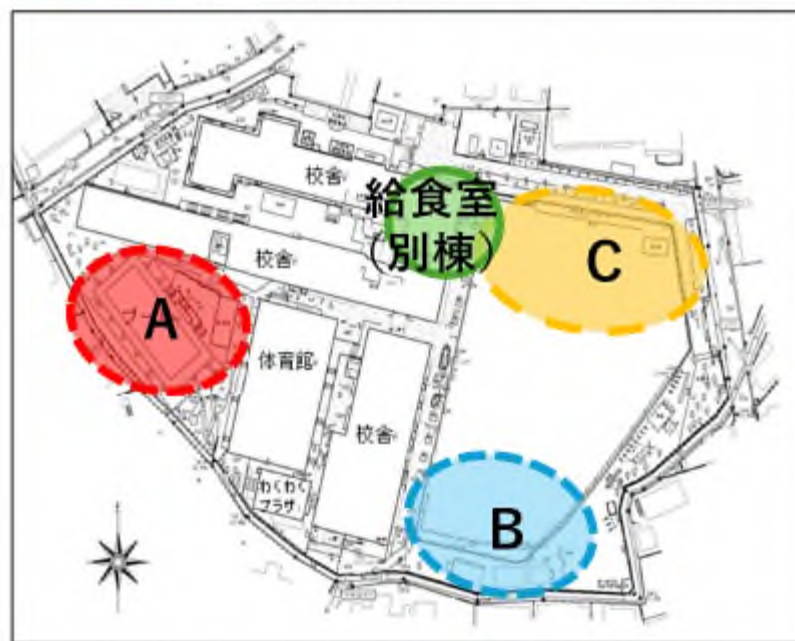

## ①増築棟を建てる位置をエリアに分けて検討

校庭及び既存校舎への日当たりや、児童の動線など、子どもたちの学校生活に与える影響をはじめ、工事の施工性や、給食食材の搬入等を総合的に検討しました（詳細はR6.5.28説明会資料を参照）。

▶校庭北側に配置することが望ましいという学校の意見を尊重した結果、Cエリアを採用するに至りました。

### 【検討のポイント】

- ・増築校舎、既存校舎の教室、校庭への日当たり
- ・給食の配膳、児童の動線、学校の管理運営面への影響
- ・工事の施工性、近隣等への影響 等

## ②近隣のグラウンド・遊休地等の活用を検討

地域の複数の団体様からのご意見が寄せられたことから、近隣のグラウンド、遊休地等の活用可能性について検討しました。

▶学校周辺に候補地がほとんどなく、民間が所有するグラウンドは、土日は福利厚生や部活動等で使用しているため、使用できる余地がない状況でした。

※平日は貸出ししているところも存在している。

# 1. 校舎増築の経緯

## ▶ 防球ネットの移設



増築校舎により校庭が常態として狭くなることに配慮し、また、増築工事中の学校活動への影響を抑えられる方法を検討しました。


▶遊具の一部を移動又は撤去し、防球ネットを後退させる工事を実施しました（R7.7～9）。

- ・鉄棒の移設位置を防球ネット裏へ変更（当初予定はグラウンド側）
- ・雲梯、砂場、タイヤ、一本橋の撤去し、肋木を北東側へ移動
- ・側溝と防球ネットを最大で約4m後退



## 2. 工事スケジュール

### ▶ 整備スケジュール

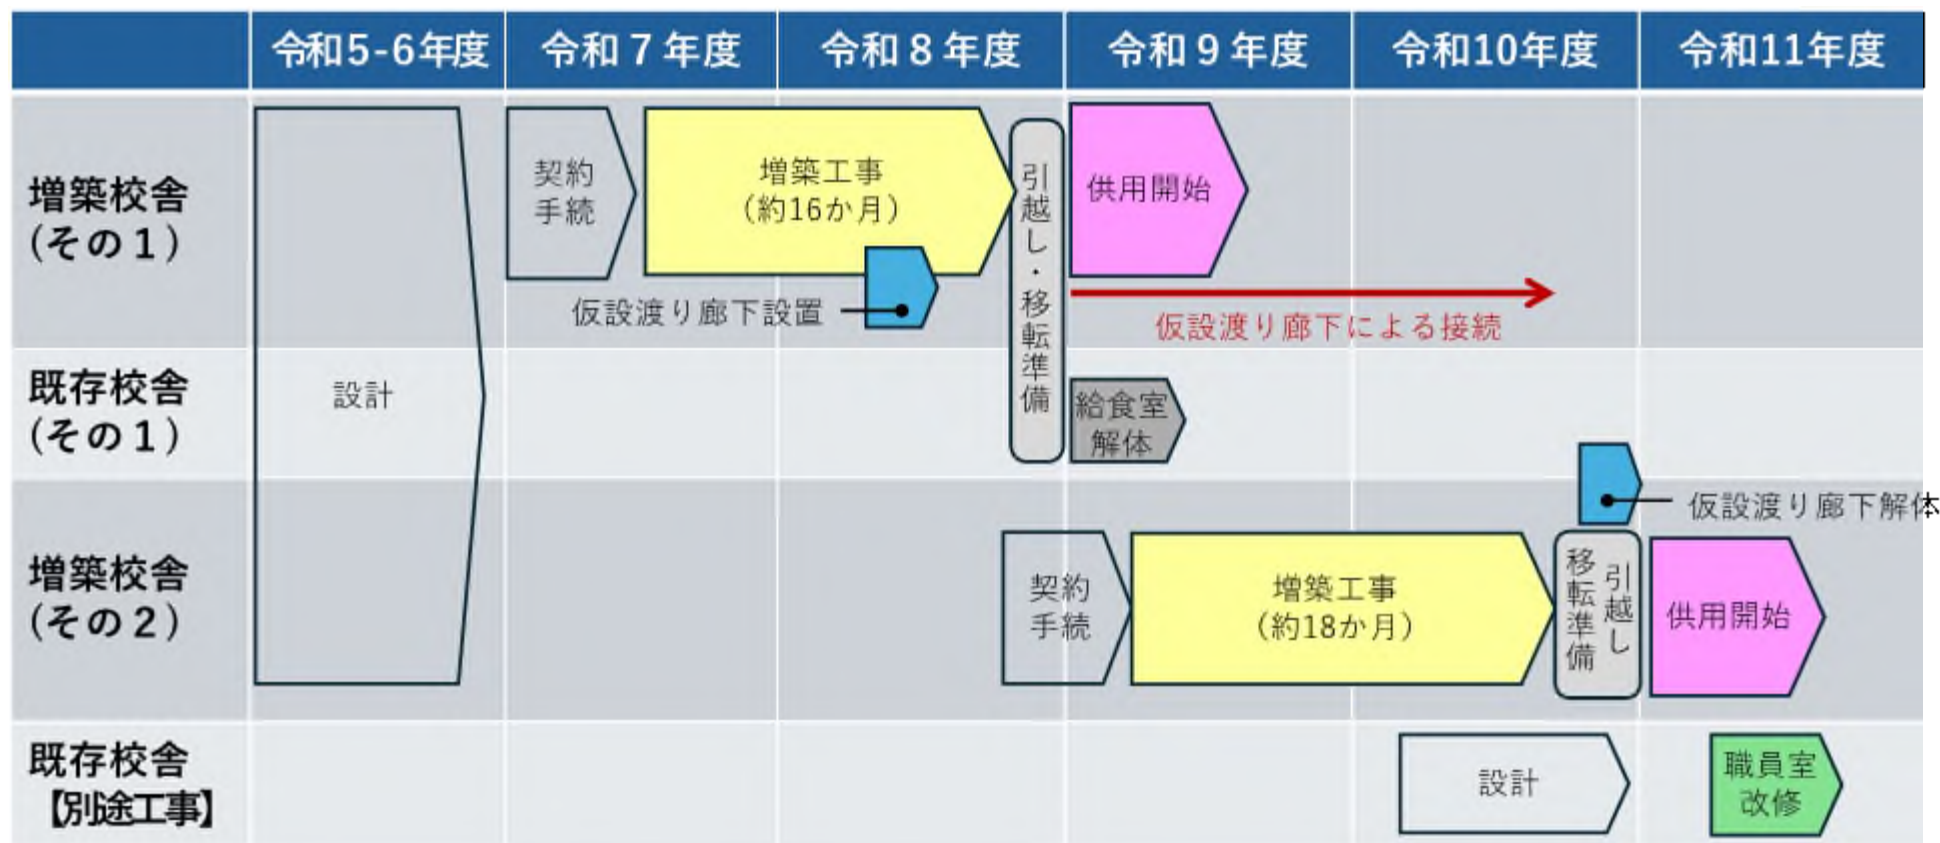

### 3. 工事範囲

#### ▶ 工事期間中の工事動線、児童動線 **1期工事**

##### ① 準備仮設・解体工事



児童・来校者は【南門のみ】を利用

##### ② 校舎増築工事（山留・土～躯体工事）



児童・来校者は【東側通用門】と【南門】を利用

### 3. 工事範囲

#### ▶ 工事期間中の工事動線、児童動線 **1期工事**

③校舎増築工事（躯体、仮設渡り廊下工事）



夏休み中（施設開放は南門を利用）

④校舎増築工事（躯体～内外装・設備工事）



児童・来校者は【東側通用門】と【南門】を利用

### 3. 工事範囲

#### ▶ 工事期間中の工事動線、児童動線 **1期工事**

##### ⑤校舎増築工事（内外装・設備、外構工事）



児童・来校者は【南門のみ】を利用

##### ⑥校舎増築工事終盤（外構工事）



児童・来校者は【正門】と【南門】を利用

### 3. 工事範囲

#### ▶ 工事期間中の工事動線、児童動線 **1 期工事**

⑦ 仮設・既存給食室解体工事



児童・来校者は【正門】と【南門】を利用

#### < 参考 >


校舎・増築、仮設渡り廊下解体工事 **2 期工事**



### 3. 工事範囲

#### ▶ 工事期間中の工事車両の経路


#### 1期工事

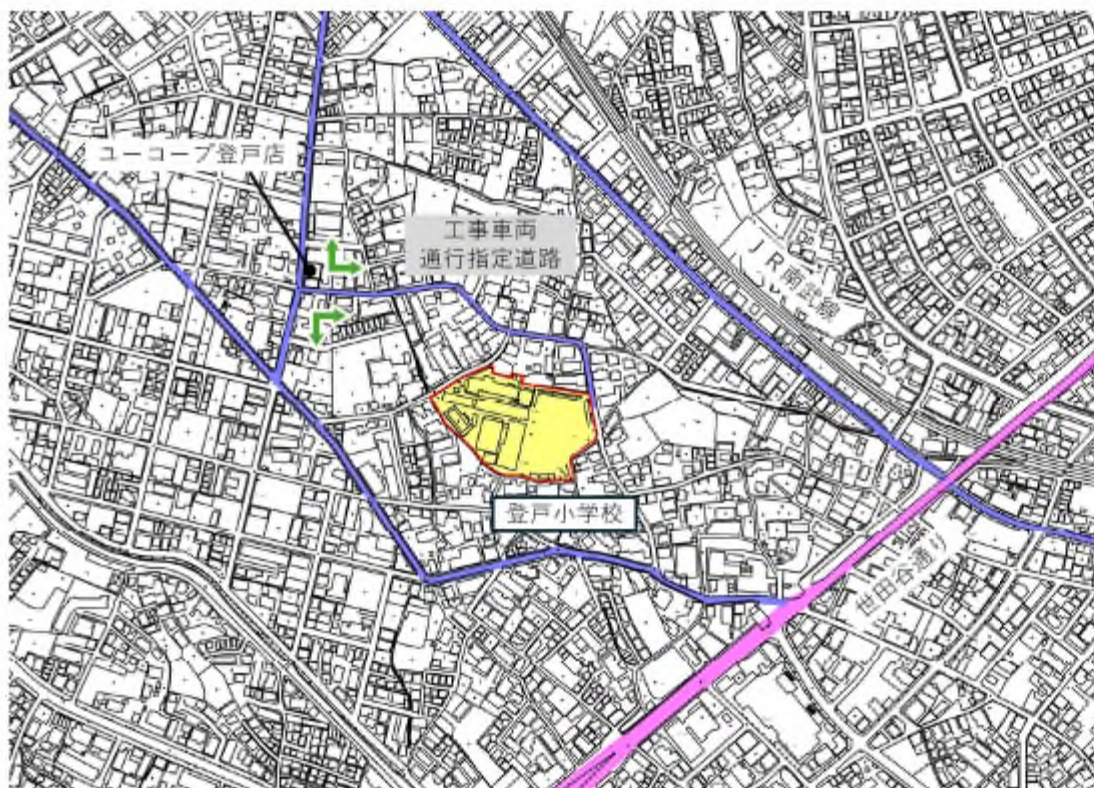

■ 登戸小学校付近における  
工事車両（特殊車両）の想定経路

- ▶ 登戸小学校敷地内へは、敷地北側の市道（登戸225）から進入（当該路線までの運行経路は車両により異なる）
- ▶ 平日の登校時間帯（午前7：50頃～8：30頃）は車両の出入りを制限
- ▶ 車両の出入りの際は、交通誘導員を配置

## 増築校舎整備内容

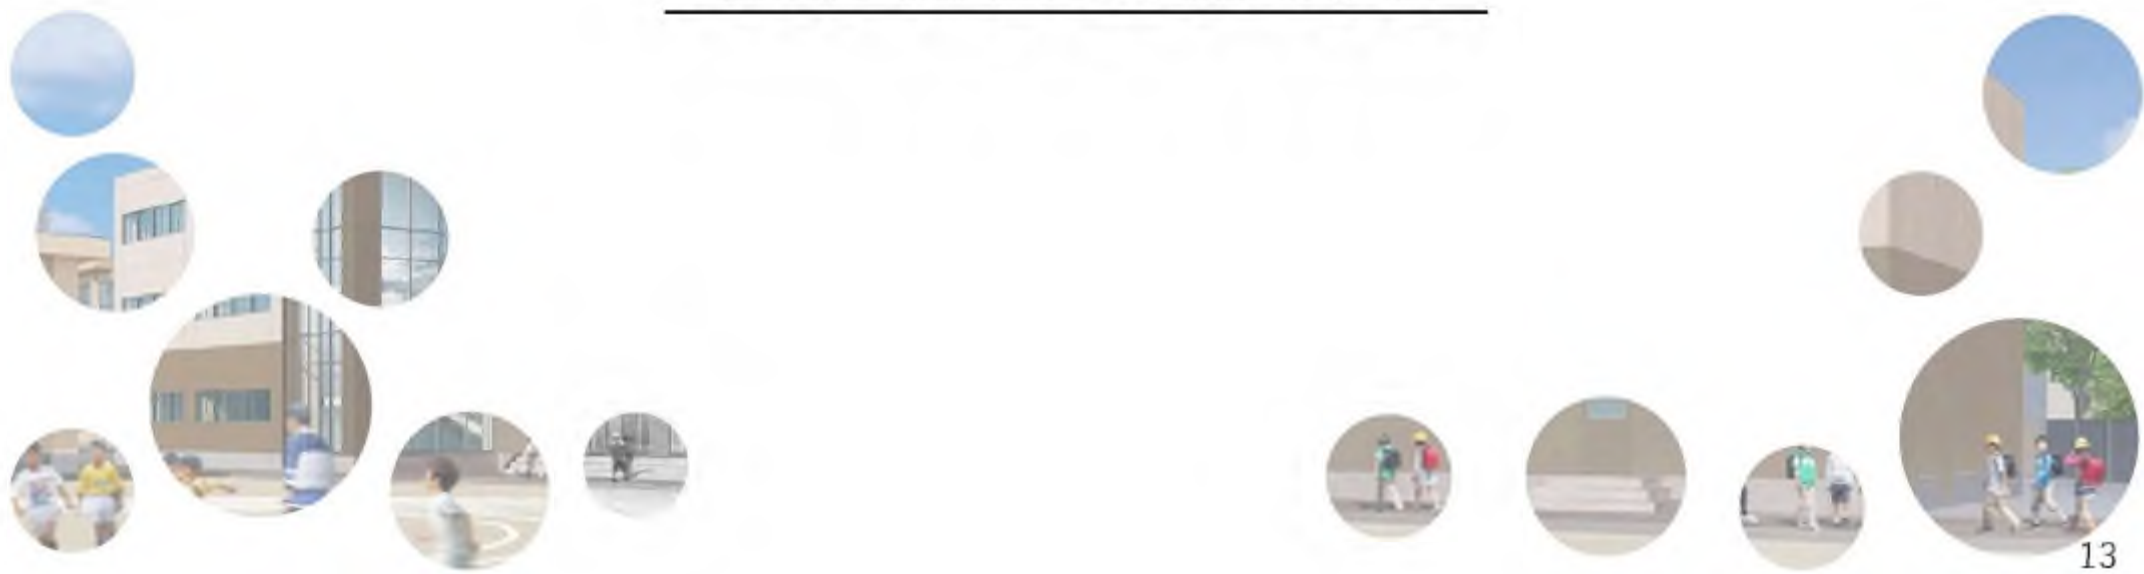

## 4. 整備内容

### ▶ 増築校舎概要



建物名称	構造	階数	建築面積	延床面積	最高高さ
増築校舎			約1,100㎡	約2,500㎡	
(その1)	RC	地上3階	(約800㎡)	(約1,500㎡)	約12m
(その2)			(約300㎡)	(約1,000㎡)	

1階：(その1)給食室、(その2)図書室、理科室

2階：(その1)普通教室4、(その2)普通教室2、多目的室2

3階：(その2)音楽室


完成イメージ



## 4. 整備内容

### ▶ 増築校舎概要


1階

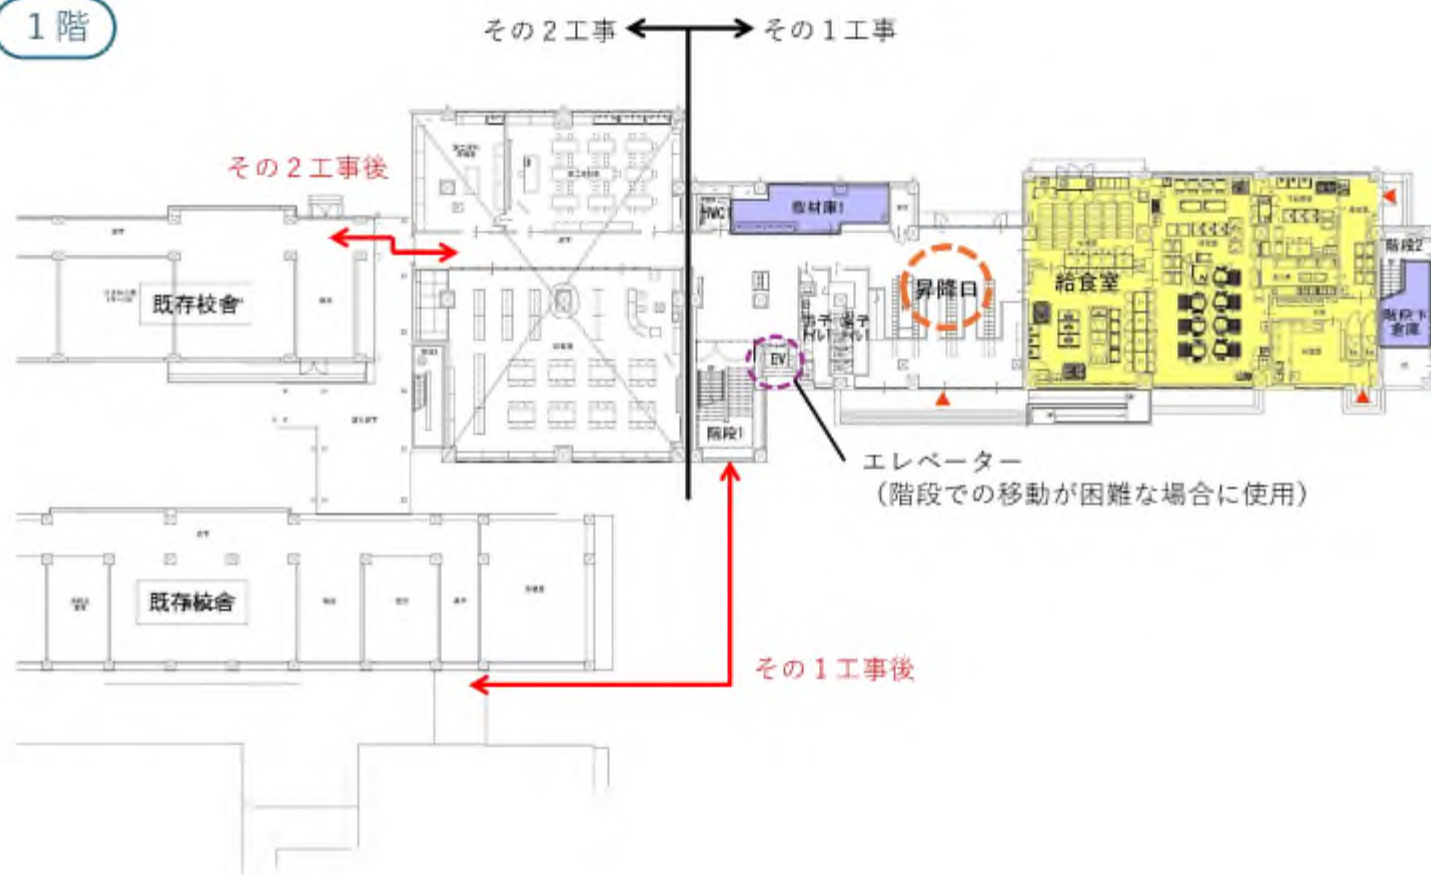


## 4. 整備内容

### ▶ 増築校舎概要

2階

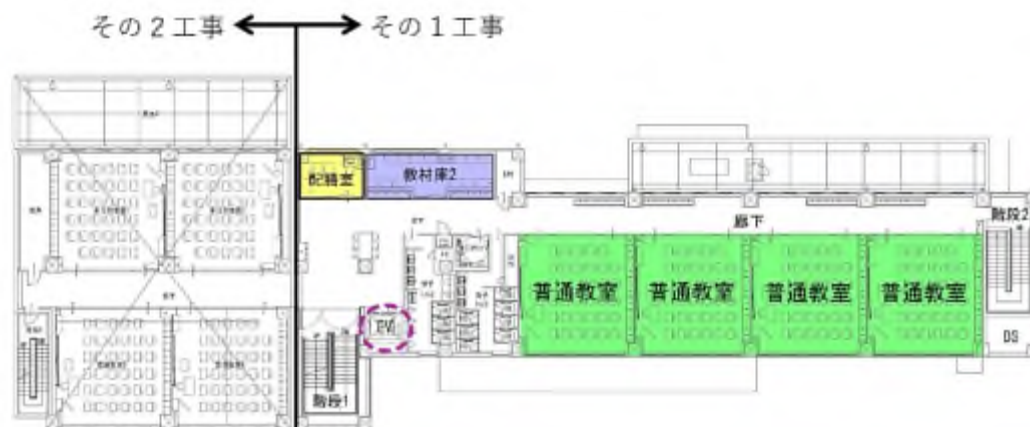


3階

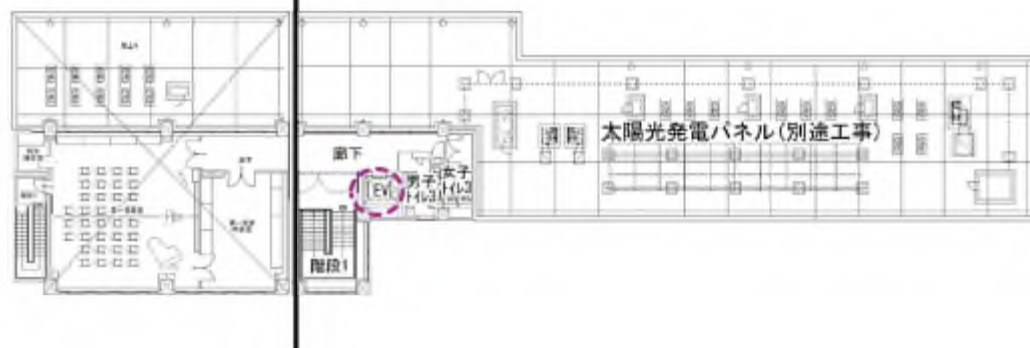

## 4. 整備内容

### ▶ 増築校舎・既存校舎間の児童動線

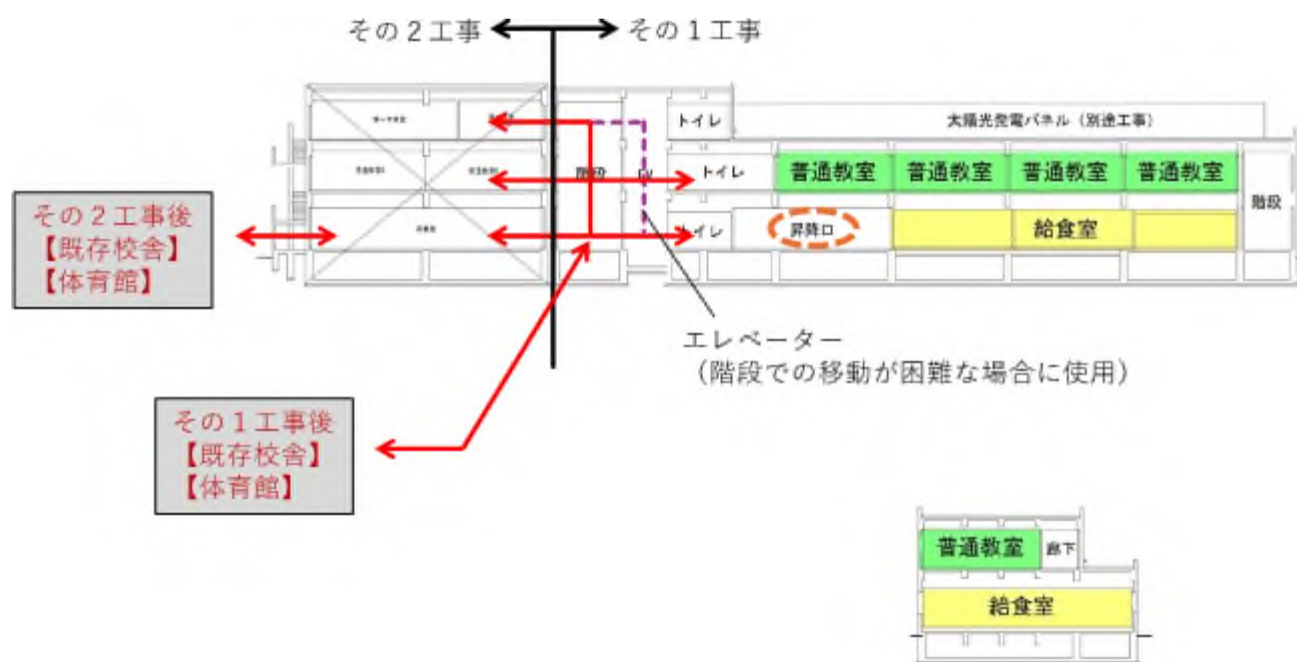

## 4. 整備内容

### ▶ 登下校・わくわくプラザの児童動線



#### <登下校>

増築校舎供用開始後はこれまで使用していた東門は車両専用門となります。登下校は正門と南門を使用します。

#### <わくわくプラザ>

わくわくプラザへの動線は、工事の前後で変更はありません。

## 5. ご協力をお願い

- 工事期間中は、特に校庭が狭くなり（1期工事R7.10～R9.6頃、2期工事R9.7～R11.3頃、改修等R11期間未定）、騒音等でご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。
- 地域の皆様には、引き続き学校施設をご利用いただき、ご意見等がありましたらお寄せくださいますようお願いいたします。
- 本資料の内容・スケジュールについては今後の進捗等により変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

ご意見、ご質問がありましたら12月19日までに下記のメールアドレスにご連絡ください。  
内容をとりまとめ、登戸小学校のホームページ上で回答を公表します（1月頃予定）  
メールアドレス：88seibi@city.kawasaki.jp
